



PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE

Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Liberté
Égalité
Fraternité

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



REGION
GUADELOUPE
Autorité de gestion

COFINANCE PAR
L'UNION EUROPÉENNE



COMITÉ TECHNIQUE N°1



Cap Excellence

Lundi 06 octobre 2025



PAPi

ORDRE DU JOUR :

1. **Avancement des actions démarrées**
2. **Programmation pour l'année 2026**
3. **Synthèse - Modification du programme /
actualisation du plan de financement**
4. **Questions diverses**




Le PAPI du territoire de Cap Excellence

- Labélisation PAPI depuis le 30 janvier 2024
- Un PAPI **multi-aléas** : Inondation et submersion marine
- Il vise notamment à **mettre en œuvre les travaux et équipements retenus dans le cadre du 1er PAPI**
- Il cherche à **poursuivre la recherche de solutions de protection et le développement de la prévention**
- Il participe à **l'adaptation des enjeux exposés et à la réorganisation de l'aménagement du territoire**
- D'un montant total de 16,3 M€ sur une durée de **6 ans (2024-2029)**

Financier	Actualisation n°2	
	COUT € HT	%
État FPRNM	5 848 317,50 €	36%
Cap Excellence	4 644 264,65 €	29%
FEDER	4 353 736,43 €	27%
Part / Entreprises / Propr	594 000,00 €	4%
Office de l'eau de Guadeloupe	330 000,00 €	2%
État BOP 181	157 500,00 €	1%
Grand Port Maritime de Guadeloupe	95 000,00 €	1%
BRGM	63 600,00 €	< 1%
Autre	45 000,00 €	< 1%
Conseil Régional	33 750,00 €	< 1%
Ville de Baie-Mahault	27 500,10 €	< 1%
Ville des Abymes	27 500,10 €	< 1%
Ville de Pointe-à-Pitre	27 500,10 €	< 1%
Routes de Guadeloupe	11 250,00 €	< 1%
TOT	16 258 918,88 €	




- Un programme de **39 actions** réparties sur les 7 axes d'action PAPI

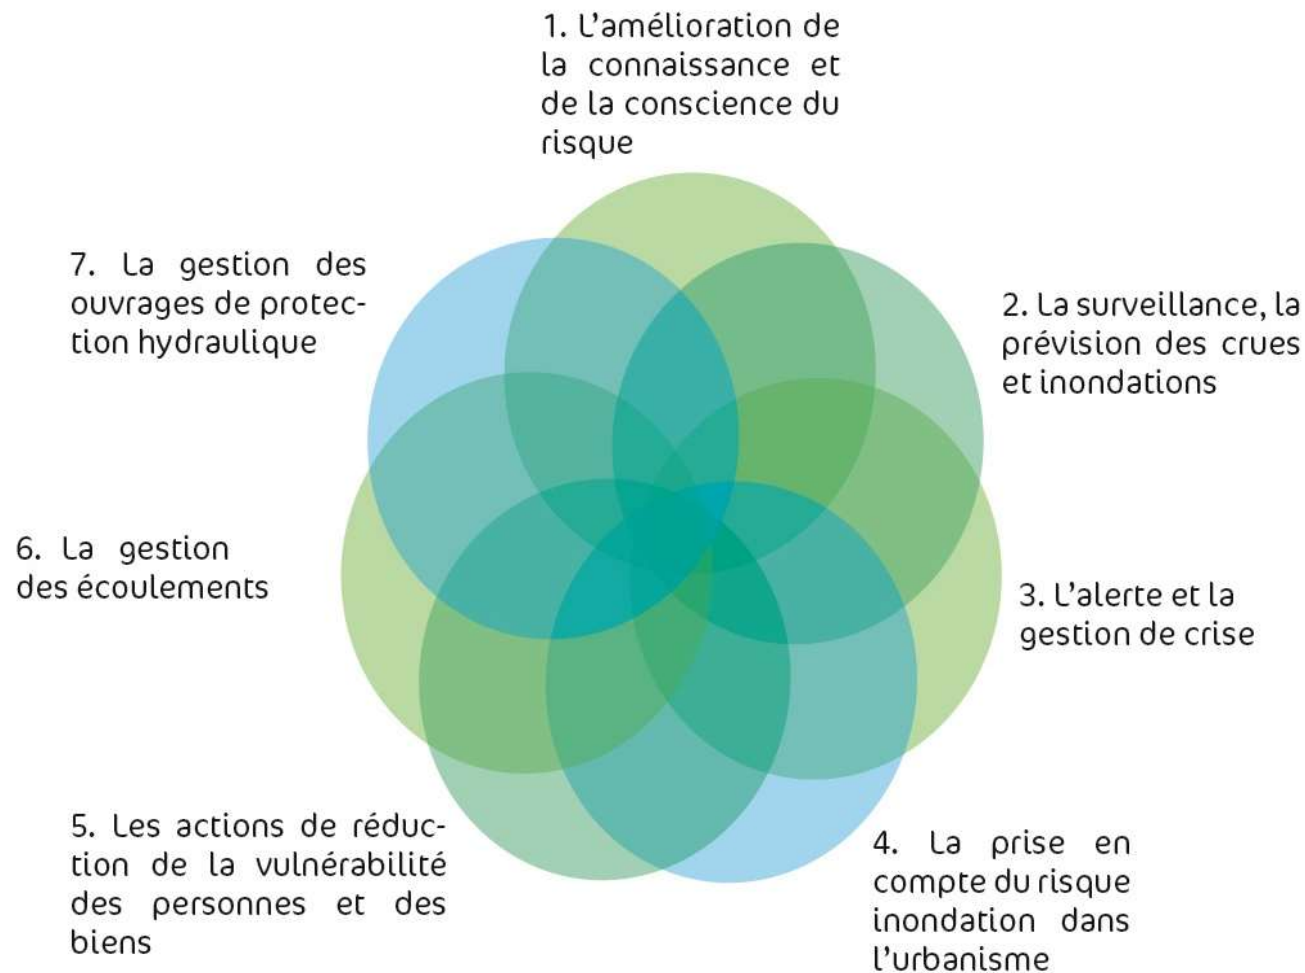

Axe PAPI	Nombre d'actions
Axe 0	2
Axe 1	13
Axe 2	0
Axe 3	5
Axe 4	4
Axe 5	4
Axe 6	10
Axe 7	1
TOTAL	39

Nombre d'actions par axe du PAPI

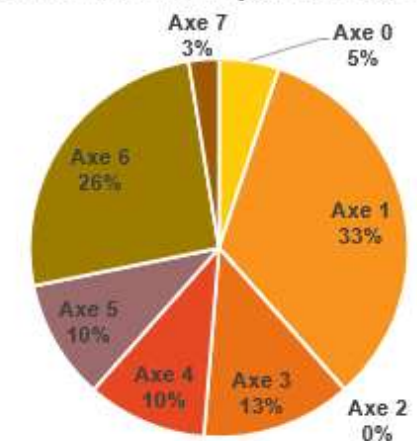

AVANCEMENT DES ACTIONS DÉMARRÉES



01

01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Recrutement de l'équipe projet PAPI (Action 0-1)

MOA : Cap Excellence

○ M. Thomas GRAVA

Chargé de mission PAPI
depuis le 03/09/2024



- Animation et coordination des actions relatives aux infrastructures hydrauliques interdépendantes
- Actions en lien avec l'aménagement du territoire, la maîtrise foncière et la réduction de la vulnérabilité

○ Mme Olivia ARISTE-ZELISE

Chargée de mission PAPI
depuis le 01/09/2025



- Animation et coordination de l'ensemble du programme
- Actions d'amélioration de la connaissance, de protection et de la conscience du risque

Indicateurs de suivi / réussite	
Réalisation des recrutements	Fait
Taux d'avancement des actions du programme (nombre d'actions lancées et finalisées, dépensées)	62% démarré
Bilan à mi-parcours et un bilan en fin de programme	NC
Nombre de réunions des instances de suivi	4

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
755 000,00 €	- 58 000,00 €	-8%	697 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement des actions de l'axe 5 (réduction de la vulnérabilité) (Action 0-2a)

MOA : Cap Excellence

- Contenu :
 - Coordination des différents intervenants,
 - Elaboration des DCE et pièces nécessaires à la consultation des prestataires,
 - Suivi exécution, administratif et financier :
 - Contrôle et la réception des prestations

Au regard du profil de Thomas GRAVA et des délais contraints, proposition de supprimer cette AMO (au profit d'une AMO hydraulique)

- Réalisation de bilans et évaluation ,

Réalisation prévue par les prestataires missionnés

--> Proposition de suppression de l'action

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
90 000,00 €	- 90 000,00 €	-100%	- €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Appui technique sur les actions 1-7 et 1-8 de modélisation hydraulique du ruissellement urbain, de la submersion marine et de la submersion chronique (nouvelle Action 0-3)

MOA : Cap Excellence



- Considérant :
 - Le profil des deux chargés de mission recrutés
 - L'ambition du programme de porter une approche innovante multi-aléas inondations engendrant une complexité hydraulique dans un contexte aux nombreuses spécificités
- Il est proposé l'ajout d'une action visant un appui technique en hydraulique
- Le CEREMA est en mesure de fournir ce niveau d'expertise par la mobilisation de profils nationaux et expérimentés
- Cette contractualisation est réalisée en quasi-régie car Cap Excellence est adhérente au CEREMA : **en-cours / démarrage fin 2025**

Indicateurs de suivi / réussite
Rédaction des éléments techniques du CCTP.
Rédaction d'avis sur les offres techniques des soumissionnaires
Production d'avis sur les livrables produits

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
- €	56 295,00 €	100%	56 295,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Poursuivre le recensement des PHE et les matérialiser par la pose de repère d'inondation et de submersion (Action 1-1)

MOA : Cap Excellence



o Contenu :

- Coordination et harmonisation des protocoles de mesure des PHE avec les villes membres → mise en place de binômes et désignation d'un responsable ; **en cours**
- Sélection des sites porteurs de marque (visites de sites prochainement) : **en cours**
- Lancement du marché pour le nivellement, la fabrication, et la pose des marqueurs et des panneaux d'information : **à faire**
- Inauguration : **à faire**

→ Objectif : pose de 30 repères



Indicateurs de suivi / réussite	
Nombre de repères posés	0
Nombre de PHE relevés	145

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
60 000,00 €	- €	0%	60 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sensibilisation au risque d'inondation du grand public (Action 1-4)

o Contenu :

- Adapter le kit de communication institutionnel du PAPI des Grands Fonds → plus inclusif avec 3 communes (dont Baie-Mahault) ;
- Abandon Kit n°2 (Bons gestes) → communication Etat par campagne « pluies intenses et inondations » (DEAL) ;
- Communication dédiée à des actions spécifiques ;
- Développement d'outils afin de renforcer la culture du risque → quizz des connaissances en ligne, visites virtuelles, simulation/visualisation 3D inondations.

→ Rédaction du CCTP en cours

MOA : Cap Excellence



Indicateurs de suivi / réussite
Nombre d'actions ayant fait l'objet de communication
Nombre de manifestations avec une présence PAPI
Nombre de connexions (vus) du quizz et des animations 3D


Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
400 000,00 €	- €	0%	400 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

- **Contexte**
- Evènements de submersion marine observés par temps calme (commune de Pointe-à-Pitre)
- Secteurs touchés fortement urbanisés
- Quelle évolution du phénomène dans le temps avec l'élévation future du niveau marin ?

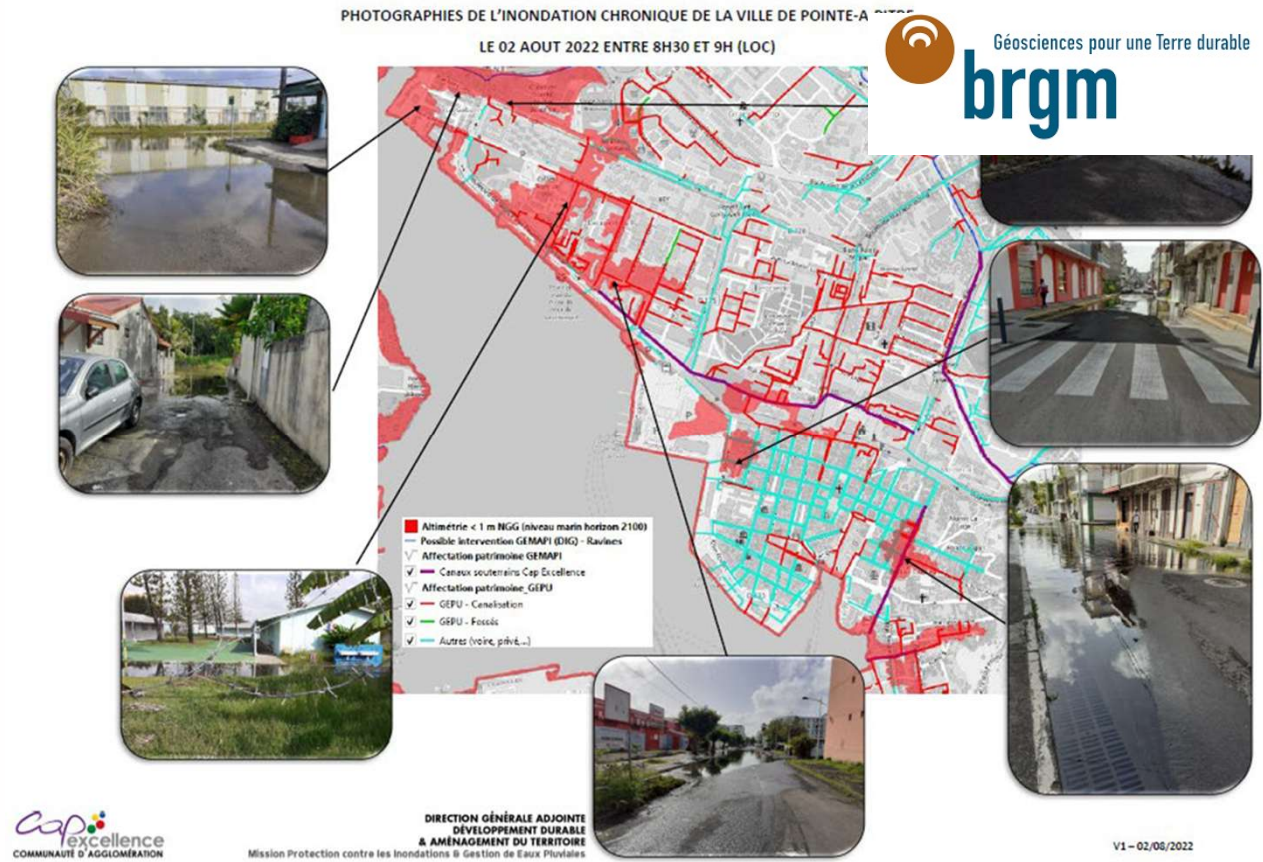





Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
318 000,00 €	- €	0%	318 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

o Etapes clés du projet :

- 1) Instrumentation sur site 
- 2) Collecte et analyse des données existantes 
- 3) Caractérisation de l'exposition actuelle aux submersions chroniques 
- 4) Projection de la submersion chronique au 21-ème siècle 
- 5) Création d'un outil de visualisation des projections



01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

o **Etapes clés du projet :** **Focus COPIL précédent**

1) Instrumentation sur site



2) Collecte et analyse des données existantes



Focus d'aujourd'hui

3) Caractérisation de l'exposition actuelle aux submersions chroniques



4) Projection de la submersion chronique au 21-ème siècle



5) Création d'un outil de visualisation des projections



01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Etude du ruissellement urbain de Pointe-à-Pitre et des Abymes (action 1-7)

MOA : Cap Excellence

Etude de la faisabilité de la protection du littoral urbain des Abymes, de Pointe à Pitre et de Jarry aux phénomènes de submersion marine (action 1-8)

o Contenu :


- Etudier des solutions techniques de protection couplant la remontée des eaux de mer l'évacuation des eaux de ruissellement ;
- Etudier des solutions de réduction et de maîtrise du phénomène de ruissellement (diminution à la source et amélioration de l'évacuation) ;
- Etudier des solutions techniques d'adaptation : réouverture des canaux, restauration des zones humides



→ Rédaction du CCTP en 2025 (CEREMA – Action 0-3)

o En attente données d'entrées indispensables :

- Attente Lidar HD – IGN prévus pour la fin d'année 2025
- Attente résultats de l'action 1-9 prévus pour la fin d'année 2025

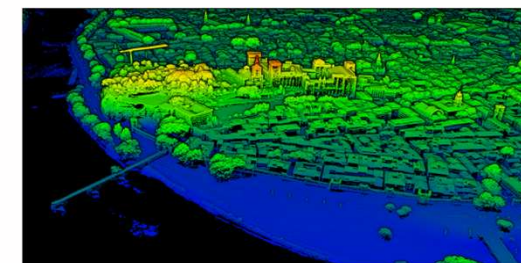

Indicateurs de suivi / réussite
Cartographie de l'aléa ruissellement
Élaboration d'un schéma d'aménagement hydraulique dédié au « ruissellement urbain »
Linéaire de littoral étudié
Nombre de solutions de protection étudiées
Nombre d'enjeux potentiellement protégés

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
200 000,00 €	- €	0%	200 000,00 €
270 000,00 €	- €	0%	270 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Elaboration et/ou actualisation des modèles hydrauliques et intégration de nouveaux scénarii d'aménagement (Action 1-10)

MOA : Cap Excellence


o Contenu :

- Rejouer les événements récents et affiner la connaissance des modèles hydrauliques ;
- Intégrer des projets d'aménagement d'envergure
- Etudier des solutions complémentaires.

Pour réduire l'aléa / Supprimer des points noirs hydrauliques / Limiter les ruissellement / restaurer des zones d'expansion de crue ou des zones humides...

- o Rédaction du CCTP (fin 2025)
- o En attente données d'entrées indispensables :
 - Lidar HD – IGN et action 1-9

Bassin versant ayant fait l'objet d'étude de solution

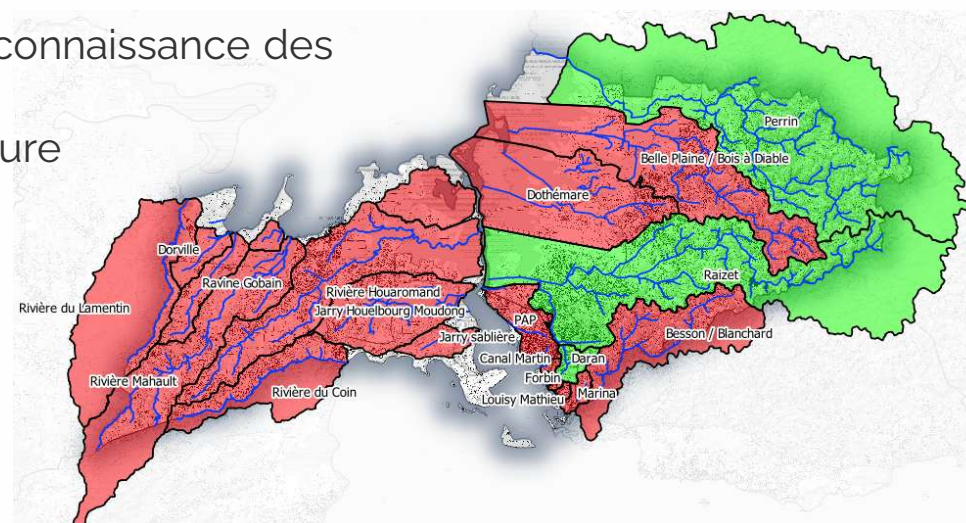

Indicateurs de suivi / réussite	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Cartographie et caractérisation des évènements majeurs récents	410 000,00 €	- €	0%	410 000,00 €
Nombre de scénarii d'aménagement complémentaires étudiés				
Nombre d'enjeux protégés				

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sensibilisation aux bons réflexes lors de pluies intenses (Action 1-11)

MOA : DEAL Guadeloupe

Renouvellement de la campagne "**Pluies intenses et inondations**", dont la 4^e vague s'est déroulée du **28 avril au 25 mai 2025**. Pas de visibilité pour 2026.

Les canaux de diffusions :

- **4 spots TV** sur Guadeloupe 1ère ;
- **2 spots radio** (créole et français) sur le groupe Puissance Guadeloupe (RCI, NRJ et Radio Bel Air) , Trace FM et Guadeloupe 1ère ;
- Du **digital** (pop-up, réseaux sociaux).

Une étude BVA est prévue en fin d'année afin de **connaître l'impact de la campagne sur le territoire** et ses besoins d'amélioration et l'intérêt de perpétuer cette campagne les années suivantes.



01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Autres actions de sensibilisation du grand public

o Journées de sensibilisation :

- 3 journées en avril, mai et juin 2025 : DEAL, Cap Excellence, Ville des Abymes,
- à venir : Semaine de la résilience – Journée de sensibilisation de la Ville de Pointe-à-Pitre le 15/10/25 à la salle George TARER de 8h à 14h

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX INONDATIONS

Mercredi 30 avril 2025

9h-16h

Fort Louis Delgrès, Basse-Terre

ENTRÉE GRATUITE
TOUT PUBLIC

La DEAL de Guadeloupe et ses partenaires vous convient à une journée exclusive de sensibilisation sur les **risques d'inondations**, afin de comprendre ces phénomènes et d'adopter **les bons gestes**.

PROGRAMME

ATELIERS LUDIQUES

Escape Game : participez à un jeu immersif grandeur nature et tentez de faire sortir votre équipe à temps.

Réalité virtuelle : plongez au cœur d'un scénario d'inondation grâce à un casque.

Maquette 2D : comprenez l'impact de l'aménagement du territoire le long d'un cours d'eau.

La boîte à risques : résolvez des énigmes autour de la thématique inondation.

STANDS D'INFORMATIONS

Venez vous informer en vous amusant !

Logos: DEAL, PIRAC, METEO FRANCE, Cap Excellence, ABYME, vers l'Excellence.

CAP EXCELLENCE
LES VILLAGES
PROJET DE TERRITOIRE

Imaginons notre territoire de demain !

Vous êtes habitants du territoire de Cap Excellence, **voilà votre avis compte !**
Rejoignez-nous dans les villages thématiques et découvrez les initiatives qui façonnent votre territoire.

cap excellence
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
ABYMES - BAIE-MAHAULT - POINTE-À-PITRE

La Guadeloupe au cœur de l'Action !

SUIVEZ-NOUS
SUR WWW.CAPEXCELLENCE.NET
OU SUR NOS PAGES

Centre Commercial Destreland
Samedi 3 mai 2025
de 9h à 19h.

Logos: Cap Excellence, ABYME, vers l'Excellence.

ABYMES
vers l'Excellence

DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES

LA CULTURE DU RISQUE POUR TOUS

2^e EDITION

FACE AUX CATASTROPHES
L'INFORMATION EST LA CLÉ

VENEZ APPRENDRE À BIEN
VOUS PRÉPARER EN FAMILLE !

SAMEDI 28 JUIN 2025
14h - 18h

FAMILY PLAZA
DOTHÉMARE

SENSIBILISATION AUX RISQUES MAJEURS ET DOMESTIQUES
- INFORMATIONS PRATIQUES - RÉALITÉ VIRTUELLE SÉISME - GESTES DE PREMIERS SECOURS -
- KITS DE SURVIE - JEUX ET LOTS À GAGNER -

05. 90. 23. 42.50

www.abymes.fr / ville des abymes

Logos: ABYMES, vers l'Excellence, DIRECTION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES, TERRITOIRES CARIBÉENS, Cap Excellence, CROIX-ROUGE FRANÇAISE PIRAC, SDIS GUADELOUPE, Ris'k, TutoRisk, ALERTE, association prévention MAIF, AFPCNT, de l'Eau DELOUPE.

01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sensibilisation au risque d'inondation des entreprises (action 1-13)



MOA : Cap Excellence

CCI ÎLES DE GUADELOUPE

Avancement :

- Phase de développement et de test réalisée avec la CCI du Var :
 - Support et outils de communication
 - Site internet (auto-diagnostic, carte interactive, documents)
- Phase de communication et de promotion du parcours terminée :
 - Dernière réunion d'information le 09/09/2025 à Pointe-à-Pitre

RISQUE INONDATION
RÉUNION DE SENSIBILISATION

Votre entreprise a-t-elle déjà été inondée ou est-elle située en zone inondable ? Participez à une réunion d'information sur les risques d'inondation et les mesures à prendre pour y faire face.

Mardi 9 Septembre
18h30
Salle Rémy Nainsouta
Pointe-à-Pitre
Inscrivez-vous !

Informations complémentaires :
territoires@guadeloupe.cci.fr
0590 93 77 49 | 0690 64 91 88

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
362 290,00 €	- €	0%	362 290,00 €

Indicateurs de suivi / réussite	
Développement du parcours de Prévention	Fait
Nombre d'autodiagnostic en ligne	NC
Nombre de visites de consultation	20 (2025)

01 Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sensibilisation au risque d'inondation des entreprises (action 1-13)

MOA : Cap Excellence

CCI ÎLES DE GUADELOUPE

- o Mission confiée à la CCI-IG par voie de convention



1

Sensibilisation



- Prise de contact avec les entreprises
 - Réunions d'information
 - Communications et autres diffusions réseaux

2

Autodiagnostic



Utilisation de la plateforme par les entreprises
Cartographie fiches pratiques, autodiagnostic,...

<https://www.risques-inondations.fr/>



3

Visite de consultation



RDV avec le conseiller CCI

CCI ÎLES DE GUADELOUPE



simples



Pré-diagnostic de consultation

Orientation

4

Audit de vulnérabilité par un cabinet d'expert



01

Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

MOA : Cap Excellence

Phase d'accompagnement et de visite des entreprises

• Depuis janvier 2025

• **363** entreprises contactées et informées sur le parcours

• **3 réunions d'informations** réalisées sur le territoire de Cap Excellence

• **Total 13*** visites de chef d'entreprise


• représentant 148 salariés,

• Par secteurs d'activité: 31 % Commerce et 31 % Services et 23% Industrie...) *dont 2 visites test



CCI ÎLES DE GUADELOUPE

Visites par secteurs d'activités



Projection

Objectif de fin d'année 2025 : 20 visites de consultations

01 Avancement des actions démarrées

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

MOA : Cap Excellence

CCI ÎLES DE GUADELOUPE

Projection

Objectif 2026 :

- Intensifier les visites terrain : 30 consultations d'entreprise
- **Renforcer la communication** de l'offre « le parcours Prévention Inondation » sur nos réseaux, site, les médias (canal10...)
- Renforcer le démarchage en porte pour l'adhésion des entreprises : en cours



ENTREPRISES

PARCOURS PRÉVENTION INONDATIONS

PAPI CAP EXCELLENCE
PROGRAMME D' ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS

Votre entreprise a déjà été inondée ? Vous avez appris récemment que votre entreprise peut être située en zone inondable ? Vous êtes inquiet des évolutions climatiques et souhaitez prendre des dispositions d'anticipation pour votre entreprise et vos salariés ?

Ce parcours vous permettra de mesurer le niveau de risque pour votre entreprise et de protéger votre établissement comme vos salariés. Il permettra aussi d'adopter les bons réflexes et d'accélérer le retour à la normale de votre activité

SOLUCCIO
Les offres

CCI ÎLES DE GUADELOUPE

cap excellence
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

REGION GUADELOUPE
COPINANCE PAR L'UNION EUROPÉENNE

PRÉFET DE LA RÉGION GUADELOUPE
Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

ABYMES
vers l'Excellence

VILLE DE BAIE-MAITHEE
VILLE DE BAIE-MAITHEE

VILLES & PAYS D'ART & D'HISTOIRE
VILLE DE POINTE-A-PITRE

971
Guadeloupe
c.a.u.e.
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

TERRES Caraïbes
REPUBLICAINE

REPUBLICAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

01

Avancement des actions démarrées

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Mutualiser un outil d'alerte hydrométéorologique et d'aide à la décision (Action 3-1)


MOA : Cap Excellence




○ Avancement :

- 5 rapports d'évènements : 12 et 13/08 2024 (Ernesto) 28/08/2024, 26/09/2024, 17 et 18/05/2025,
- 154 alertes entre le 30 juin 2024 et le 30 juin 2025

Répartition des alertes par niveau de risque

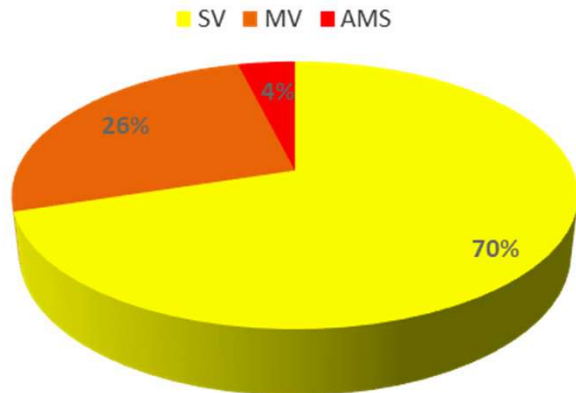

Vecteur de communication utilisé



○ Poursuite actualisation et formation des référents

Indicateurs de suivi / réussite	
Nombre d'alertes données par an	154
Nombre de rapports d'évènement	5
Nombre de ²⁵ référents formés	13

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
50 500,40 €	- €	0%	50 500,40 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Mutualiser un outil d'alerte hydrométéorologique et d'aide à la décision (Action 3-1)



- A venir : Une campagne de communication pour appeler le grand public à utiliser l'application My Predict



PROJETnce
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
ABYMES • BAIE-MAHAULT • POINTE-À-PITRE

LA MÉTÉO EN TEMPS RÉEL avec myPredict 2


Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

ALERTES EN TEMPS RÉEL

PARTICIPATION COLLECTIVE

CONSEILS PERSONNALISÉS

SCANNEZ LE QR CODE POUR PLUS D'INFOS


01

Avancement des actions démarrées


Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Elaboration du Plan Intercommunal de Sauvegarde (PICS) de Cap Excellence, actualisation des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) des Villes membres et Actualisation et diffusion des Documents d'Informations Communaux sur les Risques Majeurs (DICRIM) (Actions n°1-6, 3-2 et 3-3)

MOA : Cap Excellence



- Avancement :
 - Co-construction et concertation avec les villes membres
 - CCTP finalisé et validé
- **En attente de publication pour mise en concurrence**
- **Notification fin 2025 / début 2026**

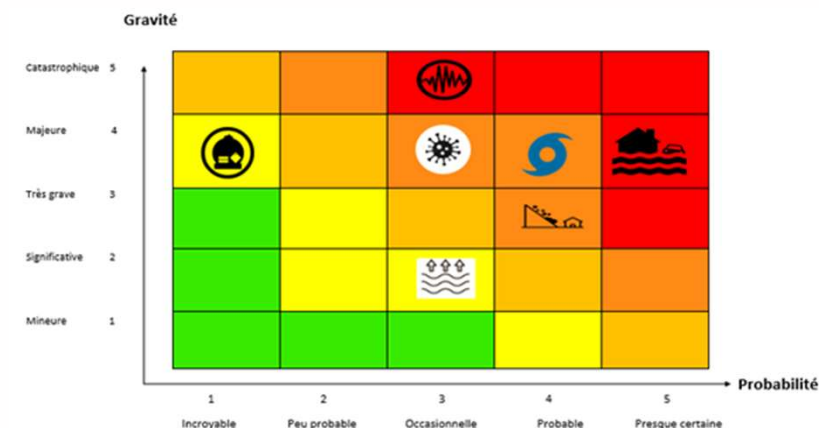

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	�cart co�t n°3 vs n°2 (�)	�cart co�t n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Poursuivre la mise � jour des (DICRIM) et les diffuser	70 000,00 �	- �	0%	70 000,00 �
Actualiser les PCS et �laborer des exercices	50 000,00 �	- �	0%	50 000,00 �
Elaborer le PICS et r�aliser des exercices intercommunaux	60 000,00 �	- �	0%	60 000,00 �

01

Avancement des actions démarrées

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Réviser les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et accompagner les Portés A Connaissance (PAC) Inondation (Action 4-5)

MOA : DEAL Guadeloupe

- **Objectifs PPRn :**
 - Délimiter les zones exposées directement ou indirectement
 - Améliorer la connaissance du risque
 - Instituer une réglementation afin d'éviter des pertes humaines et limiter les dégâts sur les biens
- **Planning prévisionnel (2025/2026) :**
 - Avis favorable des communes/EPCI → Délibération Conseil municipal & Conseil Communautaire : mai - juillet
 - **Enquête publique : Novembre 2025**
 - **Approbation : Janvier-février 2026**
- **Mesures ETPPRN :** en complément du dispositif « Woté kaz an dlo » : Mesures imposées dans le cadre du futur règlement révisé pour les bâtis existants
- Application et SAV de la mesure ETPPRN à prévoir après l'approbation des PPRN dans chaque commune



Avancement des actions démarrées

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens


Diagnostic et accompagnement à la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis exposés aux risques inondations dans le plan d'eau intermittent de l'ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou (Action 5-0)

MOA : Cap Excellence

- Phase expérimentale terminée



Les étapes de la démarche

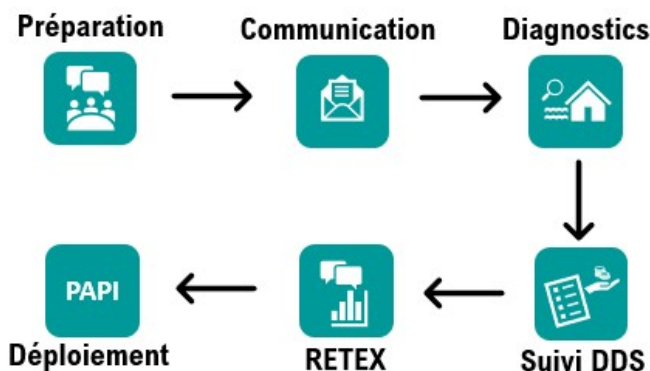

→ Objectif initial : 60 diagnostics

Indicateurs de suivi / réussite	
Nombre de diagnostics réalisés	56

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
135 000,00 €	- 25 000,00 €	-19%	110 000,00 €


01








Avancement des actions démarrées

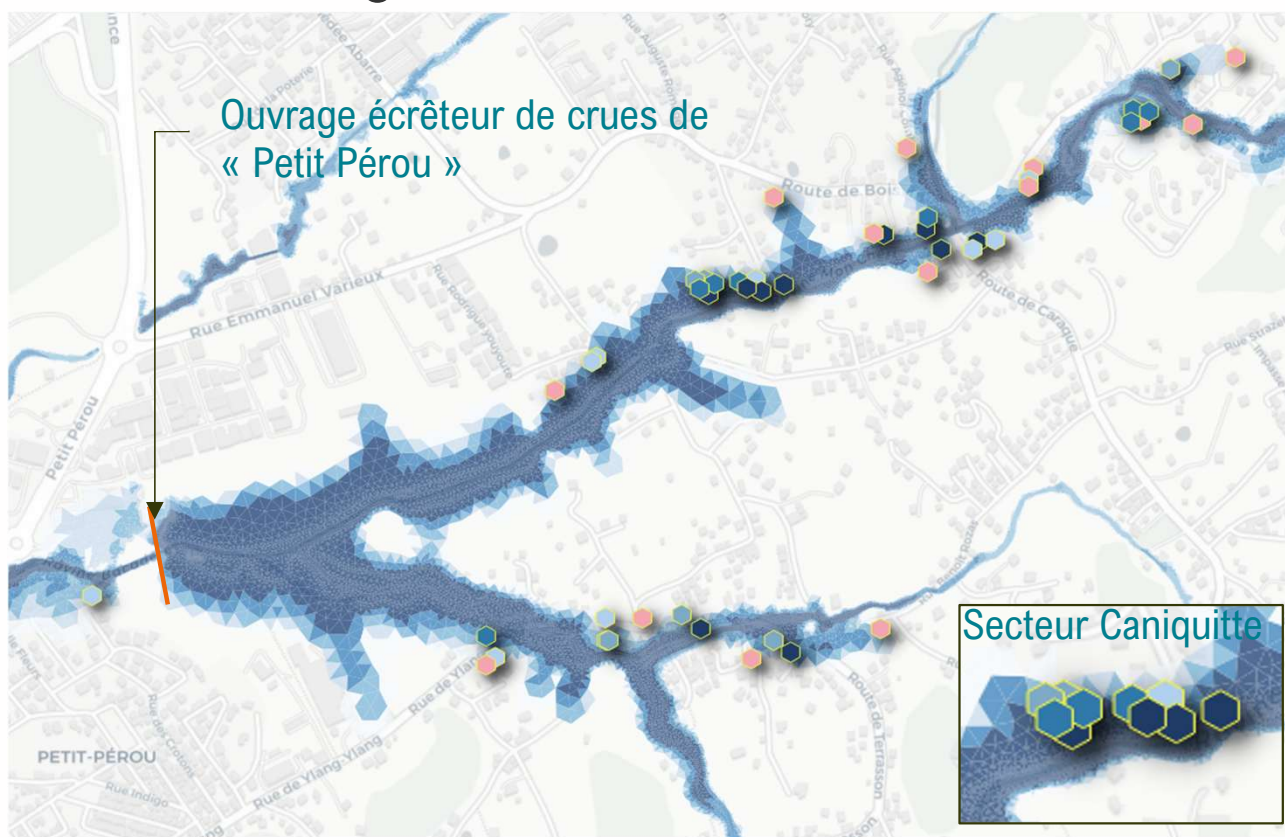Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Diagnostic et accompagnement à la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis exposés aux risques inondations dans le plan d'eau intermittent de l'ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou (Action 5-0)

MOA : Cap Excellence



-  **56 biens exposés diagnostiqués**
 - ➔ Dont **53 biens à usage d'habitation**
 - ➔ Dont **3 biens d'activités économiques**
-  Hauteur de référence nulle (14)
-  < à 0,5m (9)
-  Entre 0,5 et 1 m (7)
-  Entre 1 et 1,5 m (8)
-  > à 1,5m (10)
-  **Adaptation de la démarche**
 - ➔ **49 diagnostics simples**
 - ➔ **7 diagnostics complexes**

01


Avancement des actions démarrées

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Diagnostic et accompagnement à la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis exposés aux risques inondations dans le plan d'eau intermittent de l'ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou (Action 5-0)

MOA : Cap Excellence

- Montants estimés des engagements financiers potentiels

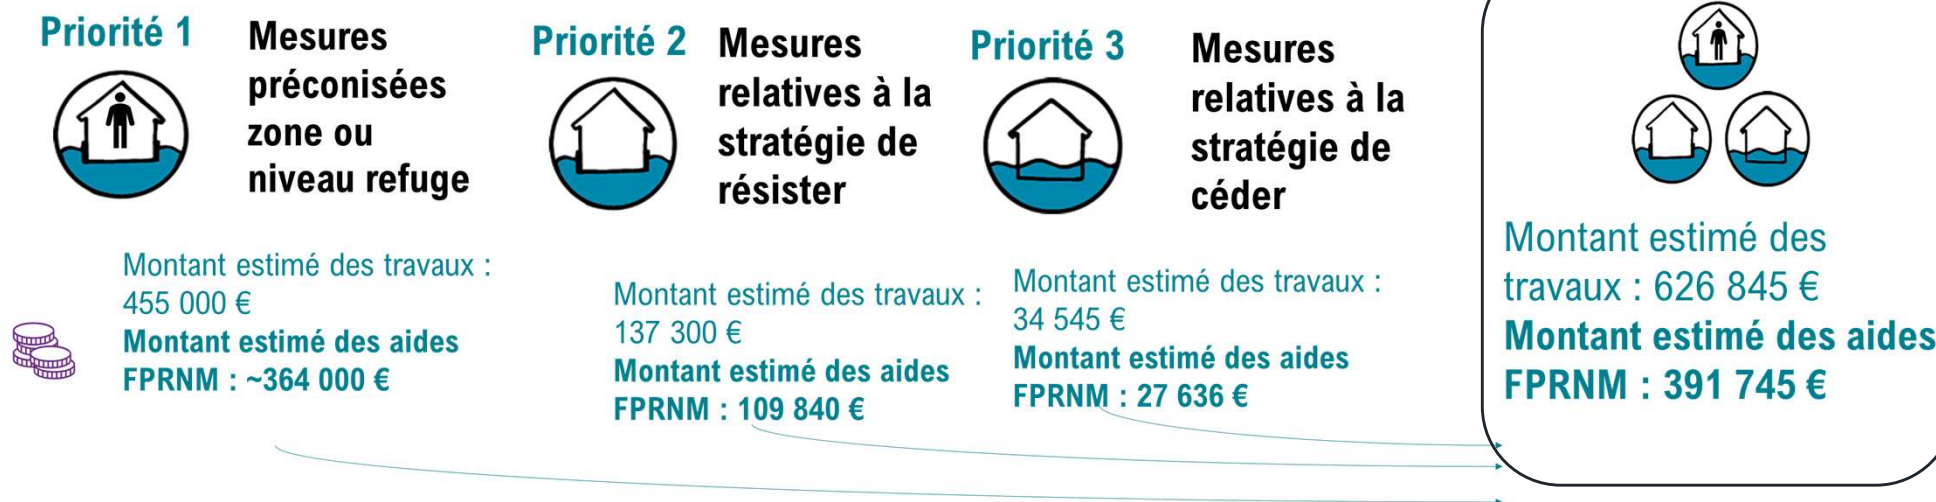


01

Avancement des actions démarrées

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

- o Vidéo témoignage sur la démarche

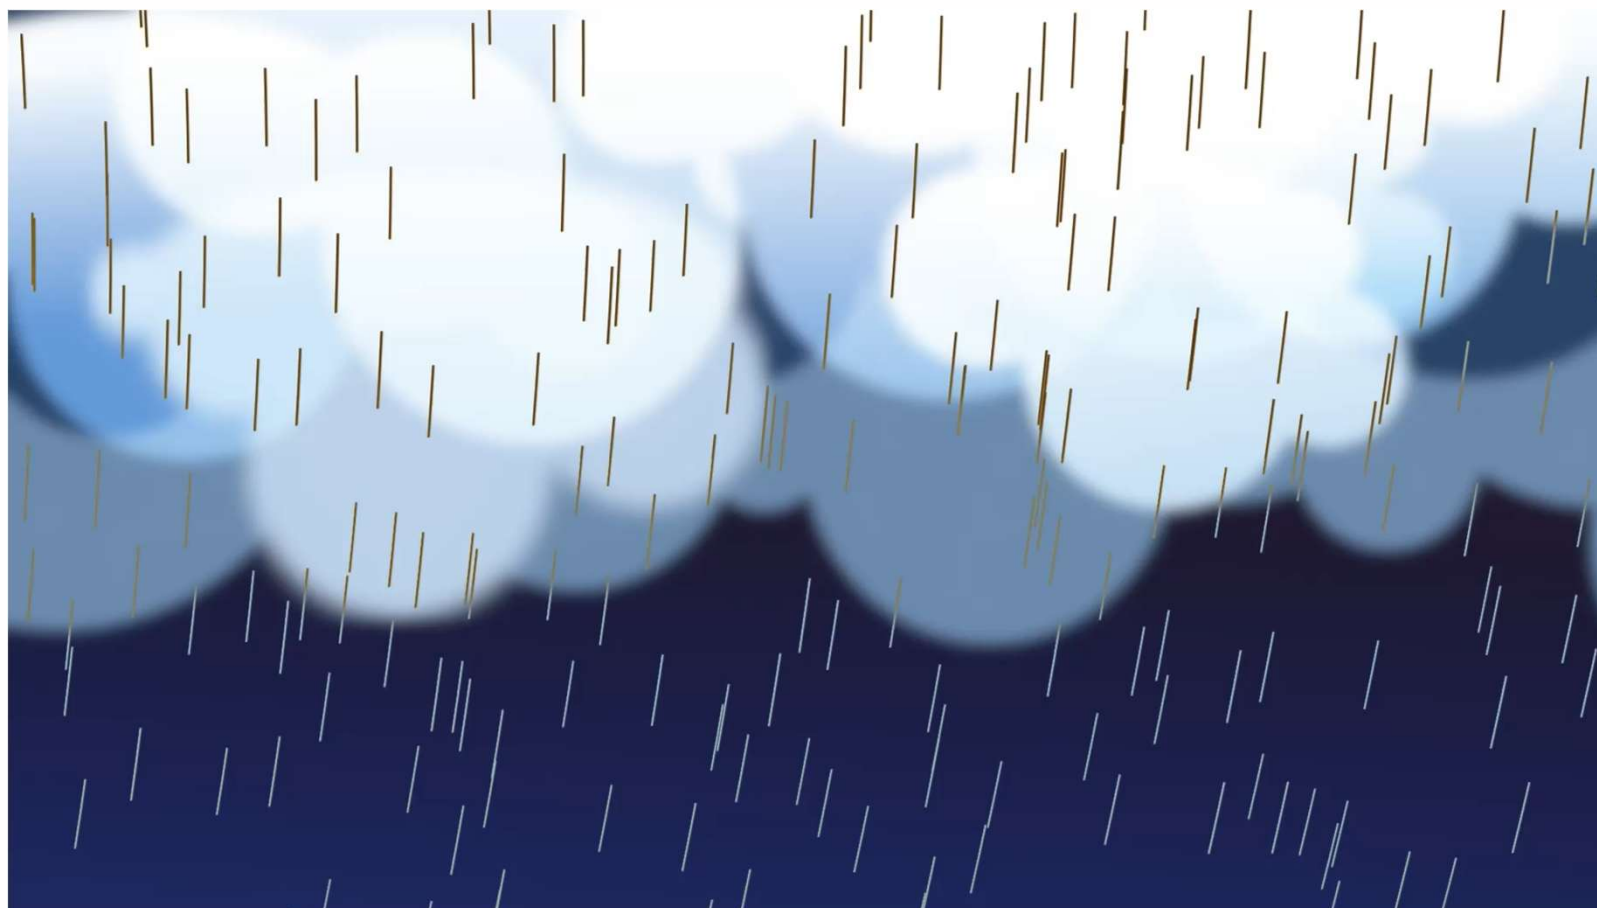

01

Avancement des actions démarrées

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Communication, diagnostic et accompagnement à la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis exposés aux risques d'inondation, de submersion et de séisme (actions 1-2, 5-1 et 5-2)

MOA : Cap Excellence

- 1^{ère} étape d'ouverture du dispositif (2026 / 2027) :
 - 300 diagnostics habitations et 45 accompagnements aux travaux
 - 75 diagnostics entreprises et 15 accompagnements aux travaux
- + *Expérimentation de 20 diagnostics multi-aléa (yc sismique)*
- **Inscription des bénéficiaires : en cours**
- **Notification du marché : en cours**
- **Re-démarrage des diagnostics : fin 2025**

Indicateurs de suivi / réussite

Nombre de diagnostics et travaux habitations

Nombre de diagnostics et travaux entreprises

Création de l'identité visuelle et de la page web dédiée / Nombre de courrier individuel transmis

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Communication d'adhésion au diagnostic de vulnérabilité à l'échelle du bâti	87 000,00 €	€ -	0%	87 000,00 €
Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis à usage d'habitation - Diagnostics	850 000,00 €	€ -	0%	850 000,00 €
Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis à usage d'habitation - Travaux	1 170 000,00 €	€ -	0%	1 170 000,00 €
Démarche de réduction de la vulnérabilité des entreprises - Diagnostics	160 000,00 €	€ -	0%	160 000,00 €
Démarche de réduction de la vulnérabilité des entreprises - Travaux	300 000,00 €	€ -	0%	300 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Etudes préalables opérationnelles et sociales d'acquisition des biens exposés ou sinistrés (Action 0-2b)

MOA : Cap Excellence



o Contenu

- Mission d'assistance technique et administrative confiée à Terre Caraïbes par voie de convention
- 1^{er} secteur prioritaire retenu au droit de « l'Impasse Caniquitte » sur le territoire de la ville des Abymes : 15 Bâtis très fortement vulnérables

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
300 000,00 €	€ -	0%	300 000,00 €

Indicateurs de suivi / réussite

Définition d'un plan de relogement

Nombre de bâtis acquis



01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Etudes préalables opérationnelles et sociales d'acquisition des biens exposés ou sinistrés (Action 0-2b)

Réunion d'information – 30 juillet 2025

Objectifs :

- Présenter l'avancement du **PAPI** et le bilan Woté Kaz An Dlo
- Recueillir les **aspirations des habitants** concernant l'avenir de l'impasse
- Collecter des informations sur chaque occupant (*coordonnées, statut d'occupation, situation familiale, etc.*)

MOA : Cap Excellence



01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Etudes préalables opérationnelles et sociales d'acquisition des biens exposés ou sinistrés (Action 0-2b)

MOA : Cap Excellence



Entretiens individuels avec les occupants – Septembre 2025

TERRES CARAÏBES a organisé ces entretiens afin de :

- Évaluer **l'éligibilité aux indemnisations disponibles**
- Effectuer une **vérification préliminaire des pièces justificatives**
- Recueillir la **volonté de donner ou non son accord**
- Identifier les **souhaits en matière de relogement**, le cas échéant

01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Etudes préalables opérationnelles et sociales
d'acquisition des biens exposés ou sinistrés
(Action 0-2b)

MOA : Cap Excellence



Bilan des entretiens menés :

- Total ménages recensés : 14 (dont 3 propriétaires fonciers/bâties)
- Entretiens réalisés : 11 / 14
- Occupants sans titre : 11 – Propriétaires : 3
- Accord pour départ/relogement : 5
- Potentielle éligibilité à une indemnisation : 6 (sur 9 occupants sans titre rencontrés)
- Refus de départ : 3
- Conditionnels (si solution adaptée/indemnité) : 3
- Souhait de relogement : 6 (majorité → Abymes)
- Situations fragiles : 2 revenus très faibles / 2 santé lourde

01

Avancement des actions démarrées

Axe 0 : Animation

Etudes préalables opérationnelles et sociales d'acquisition des biens exposés ou sinistrés (Action 0-2b)

MOA : Cap Excellence



A venir – à partir d'octobre 2025

- Recueil des pièces justificatives et mise en place des diagnostics visuels.
- Consultation pour la sélection d'une **AMO Bâti social** afin d'accompagner les occupants :
 - Montage des dossiers d'indemnisation
 - Recherche de solutions de relogement
- Poursuite des négociations pour **l'acquisition amiable** des parcelles concernées par le périmètre.

01

Avancement des actions démarrées

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

AMO et Définition d'un Plan Pluriannuel pour la programmation des travaux d'entretien, d'aménagement et de re-végétalisation des cours d'eau, ravines et canaux (Action 6-1)

MOA : Cap Excellence

- Avancement :
 - Publication et mise en concurrence n°1 : 22/11/24 au 06/01/25
→ Classement sans suite : mars 2025
 - Publication et mise en concurrence n°2 : 17/06/25 au 18/07/25
 - Attribution en cours – notification avant le 22 octobre 2025
 - Démarrage prévisionnel : fin octobre 2025 / début novembre

- **Prochaines étapes :**
 - **Notification : en cours**
 - **Programmation réunion de lancement**
 - **Volet A : Analyse des offres (MABOC TVX)**
 - **Volet B : Phase 1 – Etat des lieux**

Indicateurs de suivi / réussite

Approbation du plan pluriannuel

Programmation des interventions de l'année N

Attribution et suivi des marchés de travaux

- Incidence financière :
 - Offre retenue à +13% du cout prévisionnel

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
150 000,00 €	20 000,00 €	+ 13%	170 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Travaux d'entretien, d'aménagement et de végétalisation des cours d'eau, ravines et canaux du territoire communautaire (Action 6-2a)

MOA : Cap Excellence

○ Avancement :

- Publication et mise en concurrence n°1 : 29/02/2024 au 01/04/2024
→ Classement sans suite : 06/2024
- Publication et mise en concurrence n°2 : 04/06/2025 au 25/07/2025
- Analyse des offres : dès notification AMO (prévisionnel fin octobre 2025)
- Attribution et démarrage prévisionnel : fin novembre 2025

○ Prochaines étapes :

- Proposition programmation d'interventions 2025 en Commission Grand et Petit Cycle de l'eau le 27/10
- Notification des entreprises ≈ décembre 2025
- Edition des bons de commandes et démarrage des travaux ≈ décembre 2025

Indicateurs de suivi / réussite

Linéaire de prospection annuel / Linéaire d'intervention annuel / Nombre d'interventions annuel


Pourcentage d'avancement annuel

○ Sous consommation des crédits sur 2024/2025 en l'absence du marché en cours


Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
4 850 000,00 €	-651 625,81 €	-13%	4 198 374,19 €

01 En cours

Travaux de Nettoyage et sécurisation du canal de Chanzy

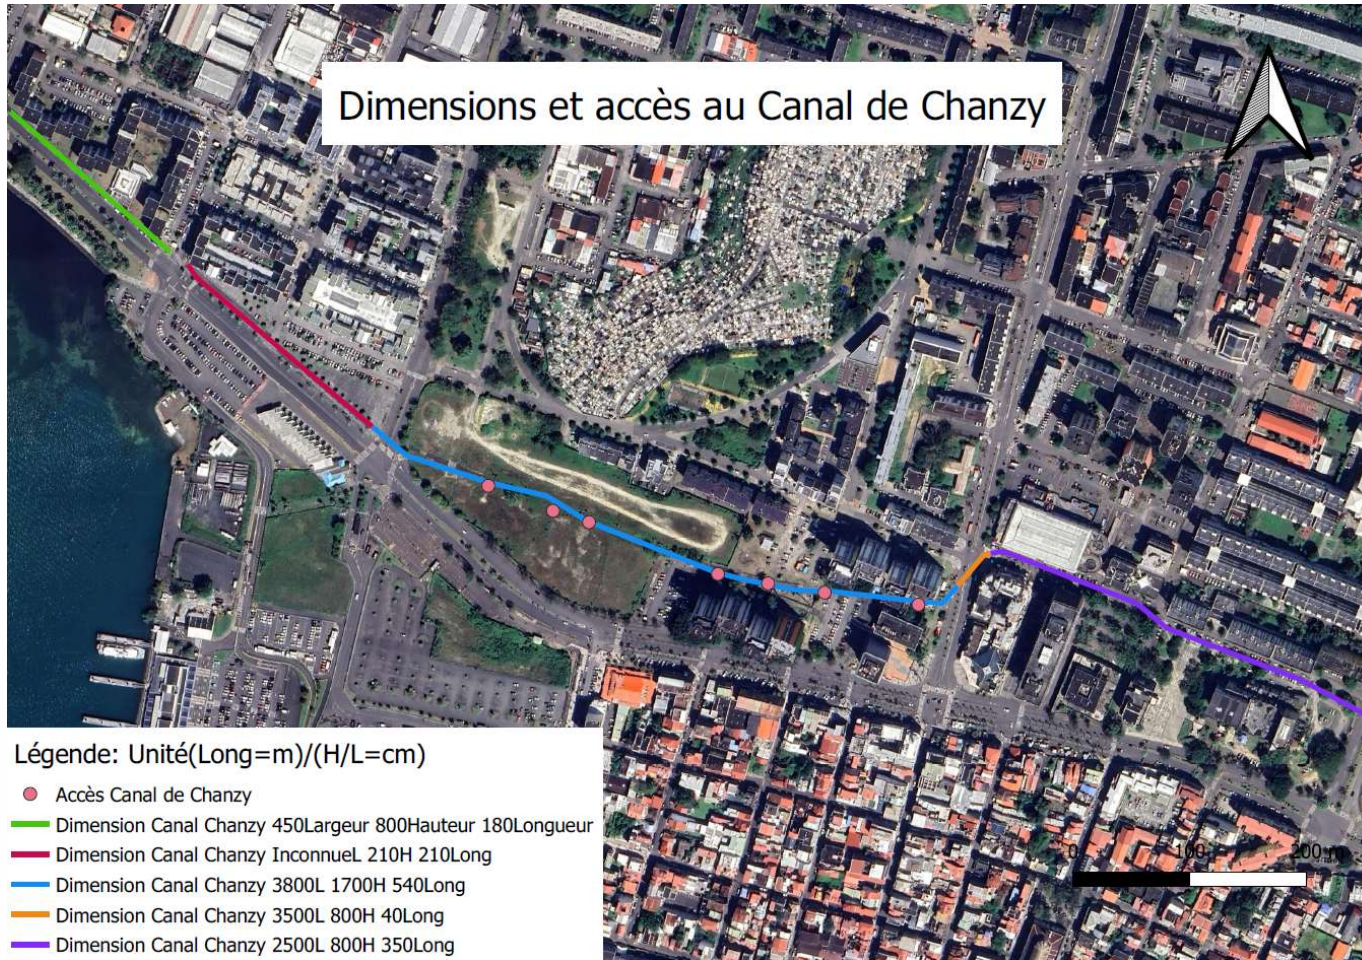

Attribution du marché en cours,
Programmation fin octobre

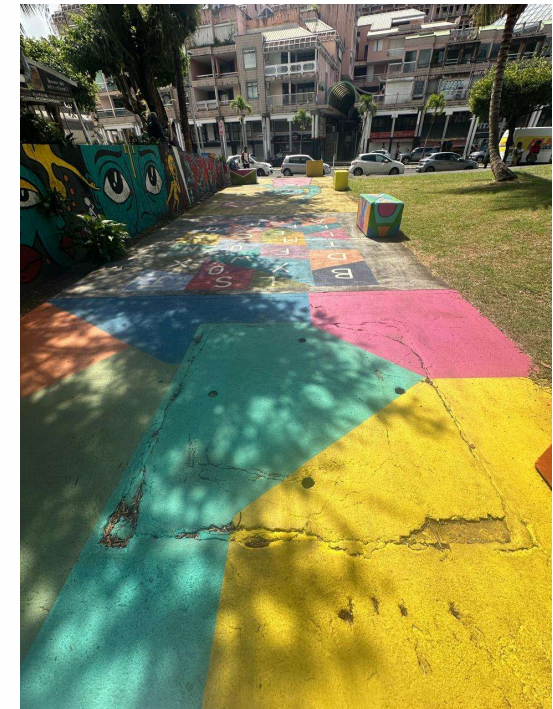

○ Montant TTC de l'opération: 99 966,35 €

01

En cours

Travaux de Sécurisation de la Ravine Bacadère au droit de l'école Notre Dame

Démarrage des Travaux : 18/08/2025



Réception des Travaux : 03/09/2025



○ Montant TTC de l'opération: 43 313,20 €

01 En cours

Traitement des demandes des Administrés

- o Nombres de demandes reçues : 3
 - 2 Les Abymes
 - 1 Pointe à Pitre
 - 0 Baie-Mahault

Canal Martin Traité

DIAGNOSTIC

Date du diagnostic: 16/09/2025

Constat sur site: Pas d'inondation constaté

Compétence identifié: GEMAPI



Impasse Caniquitte Traitée



Résidence Anquetil 2 En cours de Traitement

DIAGNOSTIC

Date du diagnostic: 05/09/2025

Constat sur site: Pas d'inondation constaté / Canalisation Fortement obstrué et dégradé


Compétence identifié: GEPU



01 En cours

Visites de terrain GEMAPI

- Prospection des cours d'eau, ravines et canaux du territoire communautaire
- Axe Prospecté ou en cours de prospection:
 - Ravine Bacadère
 - Canal Mathelot
 - Canal Vatable
 - Ravine Négresse

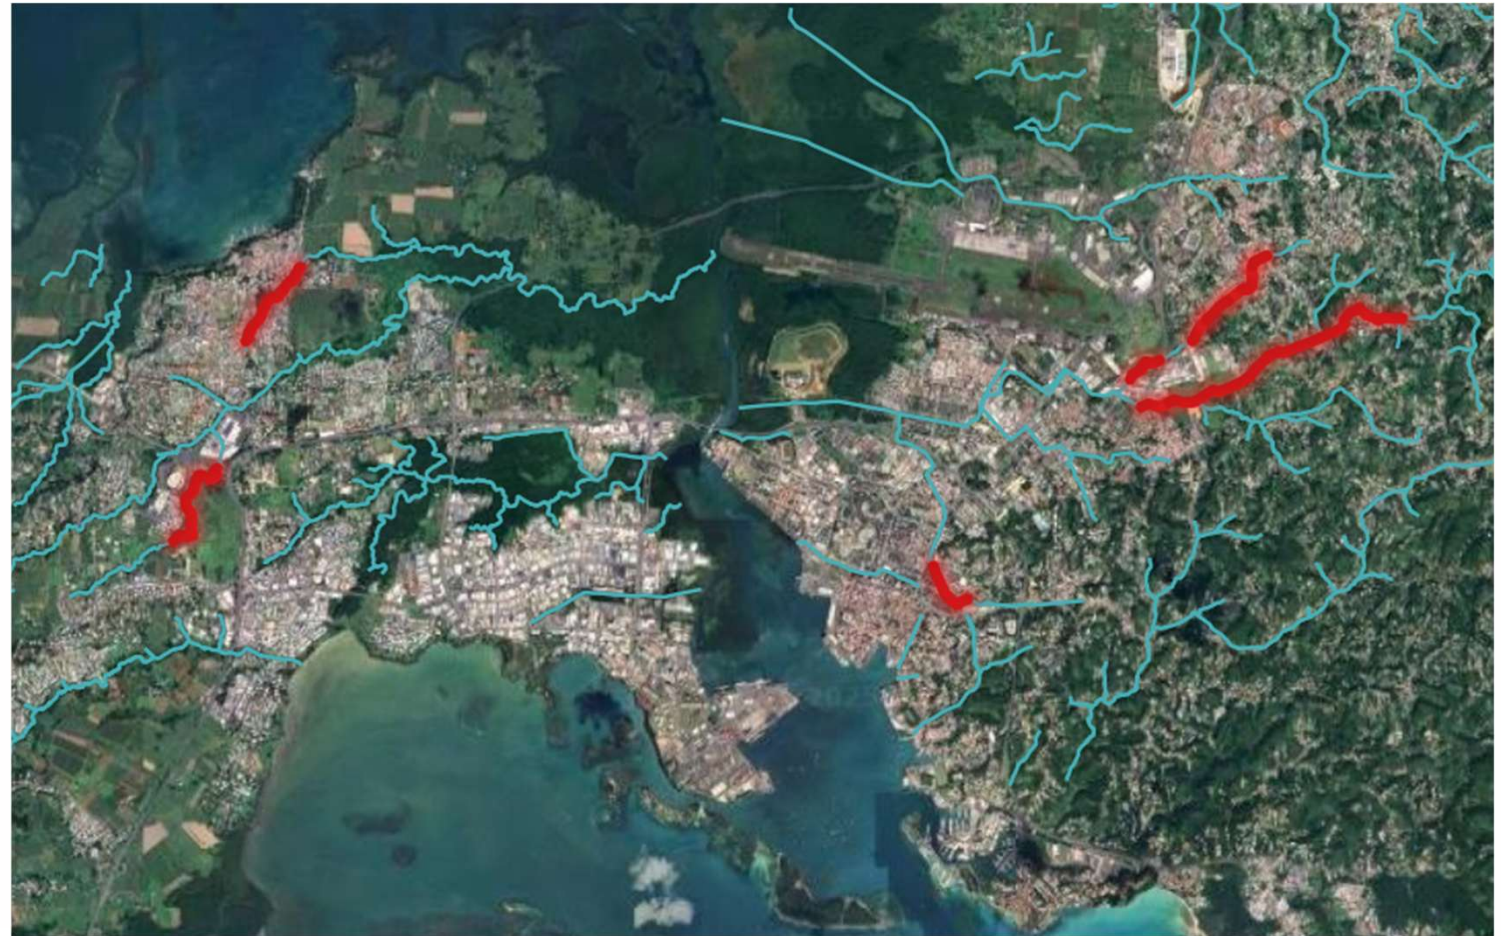

01

Avancement des actions démarrées

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Programmation et entretien du Domaine Public Fluvial (DPF) sur le territoire de Cap Excellence (Action 6-2b)

Cout prévisionnel : 200 000€/an pour la Guadeloupe dont a minima un tronçon par an pour CAPEX // (sur 6 ans) = pas d'estimatif // priorités

MOA : DEAL Guadeloupe

- En 2025, les éléments issus de la MIG 2024 n'ont pas justifié d'intervention d'entretien
- En revanche 2 tronçons prospectés durant la MIG 2025 :
Canal de Belle Plaine et **Canal de Perrin**
- DPE et autres axes d'écoulement : La DEAL demeure disponible pour des visites de terrain avec la collectivité
- Perspectives opération d'entretien 2026 :
 - en attentes des retours MIG
 - et à l'écoute remontées de particuliers et/ou des collectivités
- Pour 2026 : volonté de gagner en méthodologie pour intervenir sur les bambous



01

Avancement des actions démarrées

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou (Action 6-3)

MOA : Cap Excellence

o Avancement et prochaines étapes :

- Dès validation AVP :

- o Etudes projets (yc G2-PRO) et AMO mission SPS et CT ≈ **3 mois**
- o Etudes réglementaires (autorisation environnemental et Déclaration d'Utilité Publique) ≈ **1 an**

- Dès validation PRO et instruction dossiers réglementaires :

- o Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (DCE jusqu'à la notification des entreprises) yc G4 ≈ **6 mois**

- Dès mise au point des marchés de travaux :

- o Durée prévisionnelle des travaux ≈ **6 mois**

o Réception prévisionnelle des travaux ≈ fin 2026

Dans l'hypothèse d'une **acquisition foncière favorable par voie amiable**

Indicateurs de suivi / réussite
Réalisation des travaux de mise en conformité
Régularisation administrative de l'ouvrage

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou - Maitrise d'œuvre	315 000,00 €	- €	0%	315 000,00 €
Travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou - Travaux	1 885 000,00 €	- €	0%	1 885 000,00 €

01

Avancement des actions démarrées

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, surveiller et alerter (Action 6-6)

MOA : Cap Excellence

- Contenu :
 - Système de mesure des hauteurs d'eau en temps réel et estimation du débit
 - Retour visuel pour les levés de doute
 - Système de supervision
 - Entretien et maintenance pour une durée de 3 ans



- Avancement :
 - Pose : Terminée
 - Entretien et maintenance : En-cours

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, surveiller et alerter - Acquisition & pose	44 163,93 €	- €	0%	44 163,93 €
Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, surveiller et alerter - Exploitation et maintenance	22 764,55 €	- €	0%	22 764,55 €

PAPI

PROGRAMMATION POUR L'ANNÉE 2026

— 02

02 Programmation pour l'année 2026

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Sensibilisation au risque d'inondation en milieu scolaire (Action 1-3)

- Mise à jour de la fiche action 1-3 :
 - Abandon du projet « Tom et le mystère de Plan Familial de Sûreté » ;
 - Contractualisation avec la PIRAC pour la formation des agents en périscolaire et la fourniture des outils pédagogiques (conte, jeu de société et jeu de carte) ;

→ Modification de la fiche action

→ Démarrage début 2026/contractualisation avec la PIRAC.



Jeu de 7 familles

MOA : Cap Excellence



Conte

Plateau de jeu

Indicateurs de suivi / réussite

Nombre de personnels formés à l'animation de session de sensibilisation au risque inondation

Nombre d'élèves ayant bénéficié d'une action de sensibilisation au risque inondation

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
136 200,00 €	- €	0%	136 200,00 €

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Evaluer et mutualiser une plateforme d'information, de sensibilisation et d'alerte des populations aux risques (action 3-5)

MOA : Cap Excellence

o Contenu :

Évaluer l'opportunité de souscrire à une interface permettant de :

- Disposer d'une interface d'échange : entre la population et Cap Excellence ;
- Relayer des informations préventives ;
- Disposer d'une communauté de bénévoles mobilisables en cas de crise.



Extrait visuel AlertCata

o Prévisionnel : **Définition du besoin : S1 2026 / Rédaction du CCTP**

→ Lien avec actions 3-1 My Prédicit et 3-2 / 3-3 actualiser les PCS et PIC

Indicateurs de suivi / réussite
Nombre d'alertes (descendantes) données par an
Nombre de signalements (montants) donnés par an
Nombre de référent formé

Coût € HT Actualisation n°2 Nov. 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct. 25
30 000,00 €	- €	0%	30 000,00 €

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Etudes et travaux de confortement de berges et de restauration d'une zone d'expansion de crue de la ravine Bacadore (action 6-8)


MOA : Cap Excellence

o Contenu :

- Conforter / stabiliser les berges érodées en rive droite au droit d'enjeux ;
- Restaurer un espace de mobilité des écoulements afin de limiter le phénomène érosif ;
- Restaurer une zone d'expansion de crue.

→ **CCTP en cours de rédaction***

* Relevés géotechniques et topographiques, études préalables et travaux.

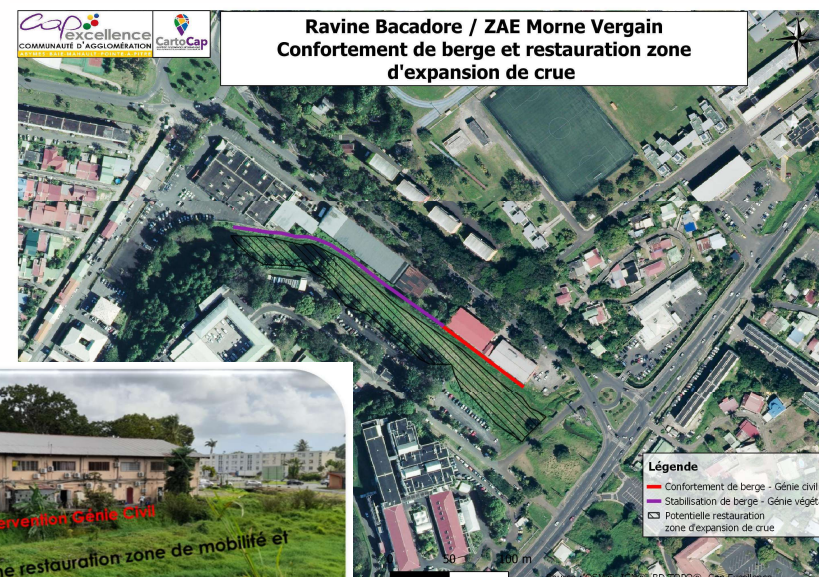

Indicateurs de suivi / réussite

Réalisation des relevés et des études opérationnelles
Réalisation des travaux

Coût € HT Actualisation n°2 (Nov. 24)	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 (Oct. 25)
500 000,00 €	- €	0%	500 000,00 €

02 Programmation pour l'année 2026

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Relevés et études préalables au déploiement de solutions immédiates de protection amovibles (Action 1-12)

MOA : Cap Excellence


○ Contenu :

- Réalisation des études préalables pour le déploiement de solutions immédiates de protection amovibles sur les secteurs soumis aux inondations de type ruissellement urbain et aux effets déjà observés de submersion chronique en marée haute (Pointe-à-Pitre)

○ Planning prévisionnel :

○ Définition du besoin : S1 2026

→ Rédaction du CCTP

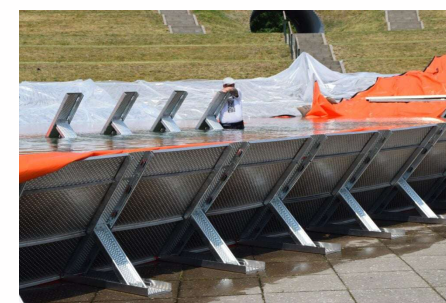

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
100 000,00 €	- €	0%	100 000,00 €

Indicateurs de suivi / réussite

Réalisation des relevés et études opérationnelles sur 1 site pilote

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Conseils, création de contenus pédagogiques, formation pour la prévention et la prise en compte des risques inondations par les aménageurs du territoire (actions 1-5, 4-2 et 4-3)

MOA : Cap Excellence



- Contenu :
 - Renforcement des compétences dans la politique de gestion du risque inondation, au travers d'un parcours de formation
 - Accompagner les services urbanisme dans la connaissance et l'instruction de projets en zone inondable
 - Diffuser aux aménageurs du territoire des éléments de connaissance sur les risques inondation et les aménagements résilients
 - Animation de ce réseau d'acteurs
- Prévisionnel : **Définition du besoin : S1 2026 / Rédaction du CCTP**

Indicateurs de suivi / réussite
Nombre de formations et de stagiaires participants
Nombre de documents d'urbanisme intégrant les données actualisées des risques inondations
Réalisation d'un guide

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Formation des acteurs de la prévention et de la gestion du risque inondation	48 000,00 €	- €	0%	48 000,00 €
Renforcer les échanges entre l'autorité en charge de la compétence GEMAPI et les services en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire	10 000,00 €	- €	0%	10 000,00 €
Renforcer les échanges entre l'autorité en charge de la compétence GEMAPI et les aménageurs du territoire	20 000,00 €	- €	0%	20 000,00 €

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Renforcer la sensibilisation, le contrôle et la lutte contre les remblais et obstructions en zone inondable (action 4-4)

MOA : Cap Excellence

o Contenu :

- Communication auprès des particuliers et acteurs du BTP sur la réglementation relative aux exhaussements de sols en zone inondable
- Sensibilisation de ces acteurs sur les impacts des exhaussements et le fonctionnement des zones d'expansion de crue
- Animer et coordonner les services de police sur des actions de contrôle et de sanction

➔ Séminaire « Le pouvoir de police sur le littoral » de AG50 pas le 13/11/2025

- Fournir aux services de police les données de connaissance de l'aléa inondation

o Prévisionnel : Définition du besoin : S1 2026 / Rédaction du CCTP

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
20 000,00 €	- €	0%	20 000,00 €

Indicateurs de suivi / réussite

Réalisation d'un guide

Nombre d'ateliers animés

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics (action 5-3)

MOA : Cap Excellence

- Contenu :
 - Similaire à l'expérimentation et au marché 2 de diagnostics :
 - Sensibilisation
 - Diagnostics
 - Accompagnement aux travaux
 - Priorité donnée aux bâtiments de gestion de crise et aux établissements scolaires et crèches
- Planning prévisionnel :
 - **Définition besoin : réalisé mars 2023**
 - **Publication et mise en concurrence du marché : fin 2ème semestre 2025**
 - **Démarrage prévisionnel : 1er semestre 2026**

Indicateurs de suivi / réussite

Nombre de diagnostics de bâtiments publics

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics - Diagnostics	80 000,00 €	- €	0%	80 000,00 €
Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics - Travaux	200 000,00 €	- €	0%	200 000,00 €

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Démarche exploratoire sur la restauration et l'aménagement de zone d'expansion de crue (action 6-5)


MOA : Cap Excellence

o Contenu

- Lutter contre les pratiques courantes d'obstruction et de remblaiement des zones d'expansion de crue
- Ralentir les écoulements des eaux de ruissellement en favorisant l'expansion et l'infiltration
- Mise en œuvre d'une démarche exploratoire

o Planning prévisionnel :

- Identification du ou des sites pilotes et études préalables : S1 2026
- Réalisation des travaux de restauration et d'aménagement : 2027

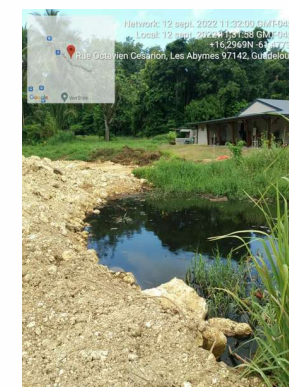

Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
500 000,00 €	- €	0%	500 000,00 €

Indicateurs de suivi / réussite

Réalisation des travaux sur au moins 1 site

Communication sur la démarche et les résultats



02

Programmation pour l'année 2026

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Etudes et acquisitions foncières pour le programme d'aménagements structurels sur le bassin versant du Raizet

Tranche 1 : Mise en conformité de l'actuel ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou	2 200 000,00 € HT
Tranche 2 : Construction d'un nouvel ouvrage écrêteur de crue au lieu-dit Bauzon (Les Abymes) – TRAVAUX HORS PAPI	2 200 000,00 € HT
Tranche 3 : Protection rapprochée de la Zone d'Activités Economiques de Morne Vergain – TRAVAUX HORS PAPI	300 000,00 € HT
TOTAL - Programme d'aménagements structurels	4 700 000,00 € HT

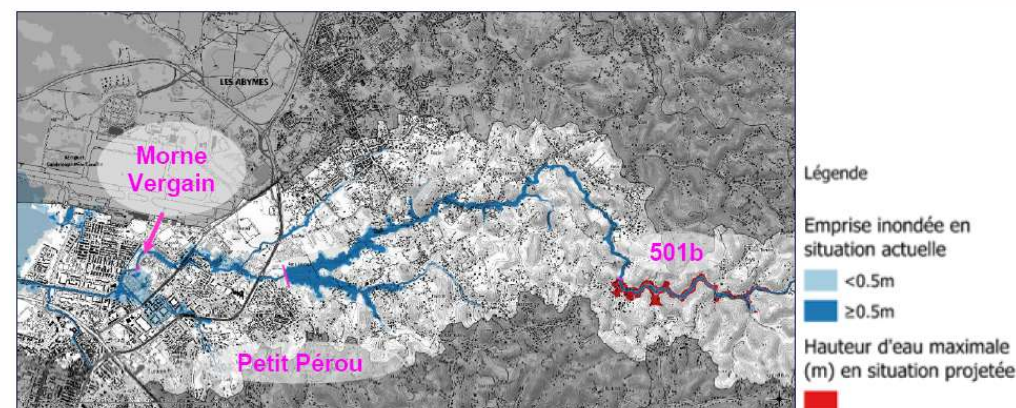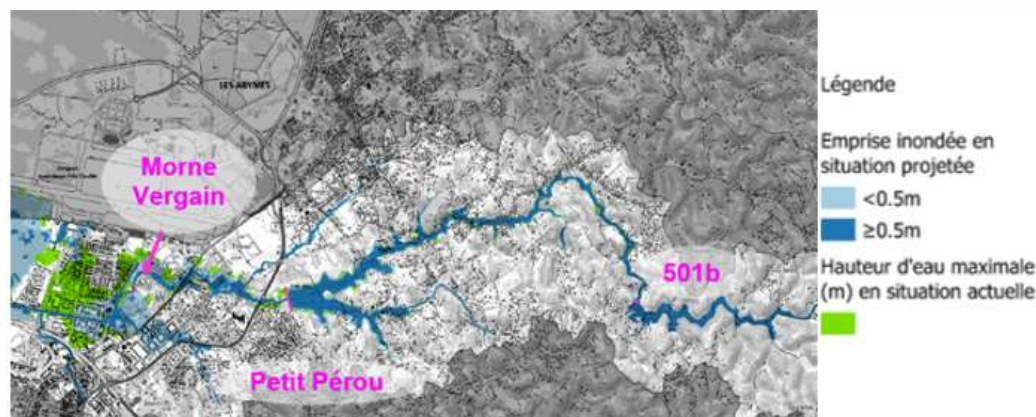

Résultats pour la pluie longue 30 ans						
Nombre de bâtis mis hors d'eau :	447	Ratio nombre de bâtis protégés / nombre de bâtis inondés :	44%	1024	Ratio coûts annualisés de la mesure € HT/ nombre d'habitants protégés :	151 €
Nombre d'habitants mis hors d'eau :	2315	Ratio nombre d'habitants protégés / nombre d'habitants inondés :	45%	5201	Ratio coûts annualisés de la mesure € HT/ nombre d'emplois protégés :	175 €
Nombre d'emploi mis hors d'eau :	2005	Ratio nombre d'emplois protégés / nombre d'emplois inondés :	39%	5126	Nombre d'enjeux (bati, habitant, emploi) en zone inondable dans le cas où Petit Pérou est mis en conformité	

02

Programmation pour l'année 2026

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Etudes et acquisitions foncières pour le programme d'aménagements structurels sur le bassin versant du Raizet

MOA : Cap Excellence

- Contenu
 - Etudes pour la construction de l'ouvrage écrêteur de Bozon (action 6-4)
 - Définir et mettre en œuvre une démarche d'acquisition et de maîtrise foncière en lien avec le programme d'aménagement (action 6-7)
 - Acquisitions foncières pour la réalisation du programme d'aménagements structurels (action 6-9)
 - Etudes pour la Protection rapprochée de la ZAE de Morne Vergain (action 7-1)
- Prévisionnel :
 - Etudes techniques et réglementaires : **Définition du besoin / Rédaction du CCTP : S1 2026**
 - Démarche d'acquisition foncière : **A l'issue des études techniques : 2027**

Action	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25
Etudes pour la construction de l'ouvrage écrêteur de Bozon	300 000,00 €	- €	0%	300 000,00 €
Définir et mettre en œuvre une démarche d'acquisition et de maîtrise foncière en lien avec le programme d'aménagement	50 000,00 €	- €	0%	50 000,00 €
Acquisitions foncières pour la réalisation du programme d'aménagements structurels	500 000,00 €	- €	0%	500 000,00 €
Etudes pour la Protection rapprochée de la Zone d'Activités Economiques de Morne Vergain	100 000,00 €	- €	0%	100 000,00 €

SYNTHÈSE :

- Avancement des actions
- ○ Modification du programme d'actions
- Actualisation du plan de financement

03 Synthèse

Avancement des actions et modification du programme

	Terminé
	Démarré
	Démarrage programmé en 2026
	Démarrage programmé en 2027

Axes du PAPI	REF	Intitulé de l'action	Avancement	Etape suivante
0	PAPI 0-1	Equipe projet chargée d'animer et de coordonner la mise en œuvre du programme d'actions		Animer, coordonner et déployer les actions du programme
	PAPI 0-2a	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement des actions de l'axe 5	Suppr	-
	PAPI 0-2b	Etudes préalables opérationnelles et sociales d'acquisition des biens exposés ou sinistrés		Recueil des pièces justificatives et diagnostics visuels des biens / Consultation pour la sélection d'une AMO Bâti social / Négociations pour l'acquisition amiable
	PAPI 0-3	Appui technique sur les actions 1-7 et 1-8 de modélisation hydraulique du ruissellement urbain, de la submersion marine et de la submersion chronique	Ajout	Réunion de lancement à programmer / déplacement du chef de projet / rédaction CCTP fin 2025
1	PAPI 1-1	Poursuivre le recensement des PHE et les matérialiser par la pose de repère d'inondation et de submersion		Harmonisation des protocoles / Sélection des sites / rédaction du CCTP pour la pose fin 2025
	PAPI 1-2	Communication d'adhésion au diagnostic de vulnérabilité à l'échelle du bâti		Notification du marché : en attente / Re-démarrage des diagnostics : fin 2025
	PAPI 1-3	Sensibilisation au risque d'inondation en milieu scolaire	Modif	Modification de la fiche action / Contractualisation PIRAC pour le déploiement des outils Paré Pa Paré périscolaires en 2026
	PAPI 1-4	Sensibilisation au risque d'inondation du grand public		Recensement manifestation dans chaque ville membre / rédaction d'une nouvelle fiche action et du CCTP fin 2025
	PAPI 1-5	Formation des acteurs de la prévention et de la gestion du risque inondation		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 1-6	Poursuivre la mise à jour des Documents d'Informations Communales sur les Risques Majeurs (DICRIM) et les diffuser à la population		En attente de publication pour mise en concurrence Notification fin 2025 / début 2026
	PAPI 1-7	Etude du ruissellement urbain de Pointe-à-Pitre et des Abymes		En attente données d'entrées LIDAR HD et BRGM (action 1-9) / Cf AMO CEREMA (action 0-3)
	PAPI 1-8	Etude de la faisabilité de la protection du littoral urbain des Abymes, de Pointe à Pitre et de Jarry aux phénomènes de submersion marine		En attente données d'entrées LIDAR HD et BRGM (action 1-9) / Cf AMO CEREMA (action 0-3)
	PAPI 1-9	Instrumentation et amélioration de la connaissance de la submersion chronique		Analyse des données / Caractérisation de l'exposition aux submersions chroniques / Livraison des livrables 2026
	PAPI 1-10	Elaboration et/ou actualisation des modèles hydrauliques et intégration de nouveaux scénarii d'aménagement		En attente données d'entrées LIDAR HD / Rédaction CCTP fin 2025
	PAPI 1-11	Sensibilisation aux bons réflexes lors de pluies intenses		Sondage d'évaluation des campagnes / Selon résultat choix de pérenniser l'action en 2026
	PAPI 1-12	Relevés et études préalables au déploiement de solutions immédiates de protection amovibles		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 1-13	Sensibilisation au risque d'inondation des entreprises		Renforcement du démarchage en porte pour l'adhésion des entreprises / Réalisation des visites de consultation

03 Synthèse

Avancement des actions et modification du programme

	Terminé
	Démarré
	Démarrage programmé en 2026
	Démarrage programmé en 2027

Axes du PAPI	REF	Intitulé de l'action	Avancement	Etape suivante
3	PAPI 3-1	Mutualiser un outil d'alerte hydrométéorologique et d'aide à la décision		Poursuite actualisation et formation des référents
	PAPI 3-2	Actualiser les Plans Communaux de Sauvegarde et élaborer des exercices		En attente de publication pour mise en concurrence Notification fin 2025 / début 2026
	PAPI 3-3	Elaborer le Plan Intercommunal de Sauvegarde et réaliser des exercices intercommunaux		En attente de publication pour mise en concurrence Notification fin 2025 / début 2026
	PAPI 3-4	Signaler et sécuriser les infrastructures routières impactées par les inondations		Concertation des gestionnaires routiers / Rédaction du CCTP
	PAPI 3-5	Evaluer et mutualiser une plateforme d'information, de sensibilisation et d'alerte des populations aux risques		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
4	PAPI 4-2	Renforcer les échanges entre l'autorité en charge de la compétence GEMAPI et les services en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 4-3	Renforcer les échanges entre l'autorité en charge de la compétence GEMAPI et les aménageurs du territoire		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 4-4	Renforcer la sensibilisation, le contrôle et la lutte contre les remblais et obstructions en zone inondable		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 4-5	Réviser les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) et accompagner les Portés A Connaissance (PAC) Inondation		Mise en équête publique : Novembre 2025 Approbation : Janvier-février 2026
5	PAPI 5-0	Diagnostic et Accompagnement à la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtis exposés aux risques inondations dans le plan d'eau intermittent de l'ouvrage écrêteur de crue de Petit-Pérou		-
	PAPI 5-1	Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtis à usage d'habitation		Notification du marché : en attente / Re-démarrage des diagnostics : fin 2025
	PAPI 5-2	Démarche de réduction de la vulnérabilité des entreprises		Notification du marché : en attente / Re-démarrage des diagnostics : fin 2025
	PAPI 5-3	Démarche de réduction de la vulnérabilité des bâtiments publics		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026

03 Synthèse

Avancement des actions et modification du programme


	Terminé
	Démarré
	Démarrage programmé en 2026
	Démarrage programmé en 2027

Axes du PAPI	REF	Intitulé de l'action	Avancement	Etape suivante
6	PAPI 6-1	Définition d'un Plan Pluriannuel, la programmation de l'année N et la passation des marchés de travaux pour l'entretien, l'aménagement et la re-végétalisation des cours d'eau, ravines et canaux du territoire communautaire		Notification : en attente / Programmation réunion de lancement / Analyse des offres (MABOC TVX) / Lancement Phase 1 – Etat des lieux
	PAPI 6-2a	Travaux d'entretien, d'aménagement et de re-végétalisation des cours d'eau, ravines et canaux du territoire communautaire		Proposition programmation d'interventions 2025 en Commission Grand et Petit Cycle de l'eau le 27/10 / Notification des entreprises ≈ décembre 2025 / Edition des bons de commandes et démarrage des travaux ≈ décembre 2025
	PAPI 6-2b	Programmation et entretien du Domaine Public Fluvial (DPF) sur le territoire de Cap Excellence		Pas de besoin recensé pour 2026 / A l'écoute des remontées de particuliers et/ou des collectivités
	PAPI 6-3a	Travaux de mise en conformité du barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou		Validation de l'AVP / Démarrage PRO et études réglementaires
	PAPI 6-4	Etudes pour la construction de l'ouvrage écrêteur de Bozon		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 6-5	Démarche exploratoire sur la restauration et l'aménagement de zone d'expansion de crue		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026
	PAPI 6-6	Instrumenter le barrage écrêteur de crue de Petit-Pérou, surveiller et alerter		-
	PAPI 6-7	Définir et mettre en œuvre une démarche d'acquisition et de maîtrise foncière en lien avec le programme d'aménagement		A l'issue des études techniques préalables (actions 6-4 et 7-1) définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2027
	PAPI 6-8	Etudes et travaux de confortement de berges et de restauration d'une zone d'expansion de crue de la ravine Bacadore		Rédaction du CCTP pour études, mesure, dossier réglementaire, travaux : 2026
	PAPI 6-9	Acquisitions foncières pour la réalisation du programme d'aménagements structurels		A l'issue des démarche préalables d'acquisition foncière (action 6-7) : 2027
7	PAPI 7-1	Etudes pour la Protection rapprochée de la ZAE de Morne Vergain		Définition du besoin / Rédaction du CCTP : 2026

03 Synthèse

Avancement des actions et modification du programme

- Sur les 39 actions du PAPI :
 - 2 actions sont terminées
 - 24 actions ont démarré en 2024 / 2025
 - 11 actions vont démarrer en 2026
 - 2 actions restent à démarrer en 2027
- L'action d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement des actions de l'axe 5 (0-2a) **est supprimée**
- L'action d'appui technique sur les actions 1-7 et 1-8 de modélisation hydraulique du ruissellement urbain, de la submersion marine et de la submersion chronique **est ajoutée**

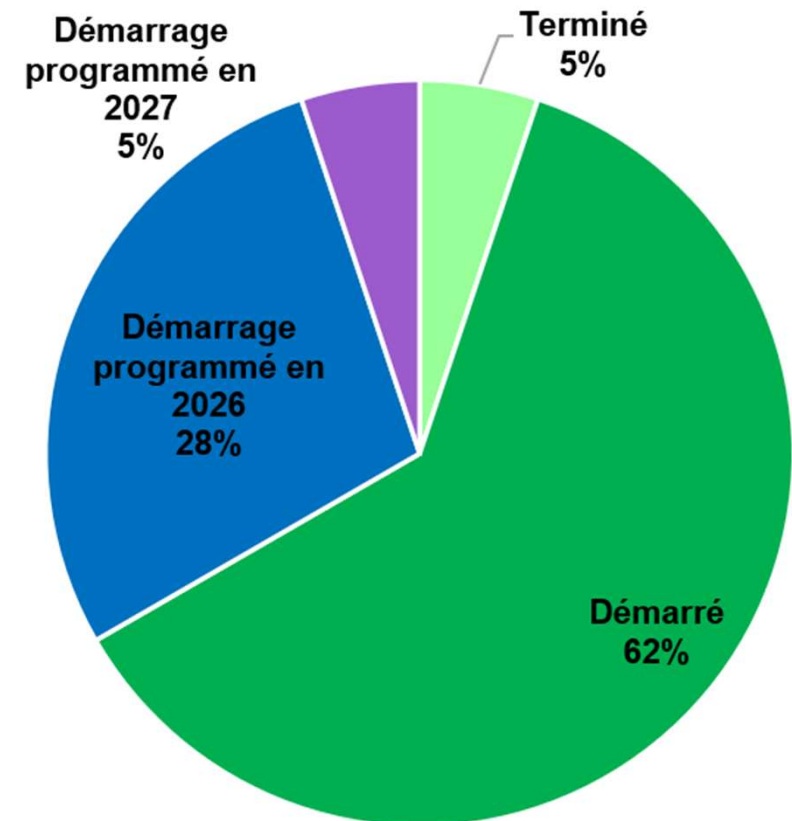

- L'action sensibilisation au risque d'inondation en milieu scolaire **est modifiée**

03 Synthèse

Actualisation du plan de financement

PAPI du territoire de Cap Excellence
Prévisionnel sur la période 2024-2029
Actualisation n°3 - Oct 2025

Financier	Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25	Écart coût n°3 vs n°2 (€)	Écart coût n°3 vs n°2 (%)
État FPRNM	5 848 317,50 €	5 793 318,74 €	- 54 998,76 €	-1%
Cap Excellence	4 644 264,65 €	3 996 388,84 €	- 647 875,81 €	-14%
FEDER	4 353 736,43 €	4 304 530,19 €	- 49 206,24 €	-1%
Particuliers / Entreprises / Propriétaires	594 000,00 €	594 000,00 €	- €	0%
Office de l'eau de Guadeloupe	330 000,00 €	334 000,00 €	4 000,00 €	1%
État BOP 181	157 500,00 €	157 500,00 €	- €	0%
Grand Port Maritime de Guadeloupe	95 000,00 €	95 000,00 €	- €	0%
BRGM	63 600,00 €	63 600,00 €	- €	0%
Autre	45 000,00 €	51 000,00 €	6 000,00 €	13%
Conseil Régional	33 750,00 €	27 500,00 €	- 6 250,00 €	-19%
Ville de Baie-Mahault	27 500,10 €	27 500,10 €	- 0,00 €	0%
Ville des Abymes	27 500,10 €	27 500,10 €	- 0,00 €	0%
Ville de Pointe-à-Pitre	27 500,10 €	27 500,10 €	- 0,00 €	0%
Routes de Guadeloupe	11 250,00 €	11 250,00 €	- €	0%
TOTAL	16 258 918,88 €	15 510 588,06 €	- 748 330,82 €	-5%

03 Synthèse

Actualisation du plan de financement

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Coût € HT Actualisation n°2 Nov 24	21 582,13 €	1 323 290,64 €	3 452 832,74 €	4 606 760,11 €	2 735 606,53 €	2 181 055,98 €	1 937 790,75 €	16 258 918,88 €
Coût € HT Actualisation n°3 Oct 25	48 405,76 €	444 673,15 €	1 317 371,70 €	3 985 219,35 €	5 293 545,72 €	2 359 818,81 €	2 061 553,58 €	15 510 588,06 €
Écart coût n°3 vs n°2 (€)	26 823,63 €	- 878 617,49 €	-2 135 461,04 €	- 621 540,76 €	2 557 939,19 €	178 762,83 €	123 762,83 €	- 748 330,81 €
Écart coût n°3 vs n°2 (%)	124%	-66%	-62%	-13%	94%	8%	6%	-5%

- Du retard pris sur 2024 – 2025 :
 - Recrutement tardif de l'équipe projet (0-1)
 - Délais dans les procédures marchés
- Rattrapage essentiellement provisionné sur 2026 - 2027 :
 - Sauf pour les travaux d'entretien, d'aménagement et de re-végétalisation des cours d'eau, ravines et canaux du territoire communautaire (6-2a) : maintien d'un prévisionnel d'environ 800 k€ / an (essentiellement financé par la Taxe GEMAPI)



**PRÉFET
DE LA RÉGION
GUADELOUPE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

L'EUROPE S'ENGAGE EN
GUADELOUPE



COFINANCE PAR
L'UNION EUROPÉENNE

PAPI



Merci pour votre attention!

ABYMES



VILLES
& PAYS
D'ART &
D'HISTOIRE
POINTE-À-PITRE

971

Guadeloupe
cl.a.u.e

Conseil d'architecture, d'urbanisme
et de l'environnement



TERRES
Caraïbes

